

様 高天井照明LED化改修工事


■照度測定結果

測定日	2020/7/22	2020/7/15	2020/7/22	2020/7/29
対象倉庫	A-3	A-1	A-3	B-3
	交換前	交換後		
1	12.7	101.0	111.5	117.8
2	29.0	204.0	206.0	214.0
3	101.0	225.0	334.0	279.0
4	89.5	109.0	120.0	125.1
5	93.5	137.0	141.3	145.2
6	68.8	168.0	186.3	183.1
7	84.0	183.0	187.1	183.5
8	103.1	144.0	146.2	143.7
9	32.5	160.0	158.4	142.7
10	194.0	199.0	198.1	198.2
11	136.0	203.0	205.0	198.4
12	32.0	142.0	160.3	109.4
13	87.0	155.0	168.5	159.0
14	130.0	204.0	227.0	207.0
15	117.0	207.0	223.0	203.0
16	129.0	152.0	136.3	121.0
17	29.5	133.0	137.7	108.6
18	164.5	308.0	351.0	353.0
19	190.0	316.0	516.0	399.0
20	27.1	124.0	177.0	125.8

(単位：lx)

注) 日中シャッター解放時に測定実施したため、参考値とする。

■倉庫内 測定ポイント

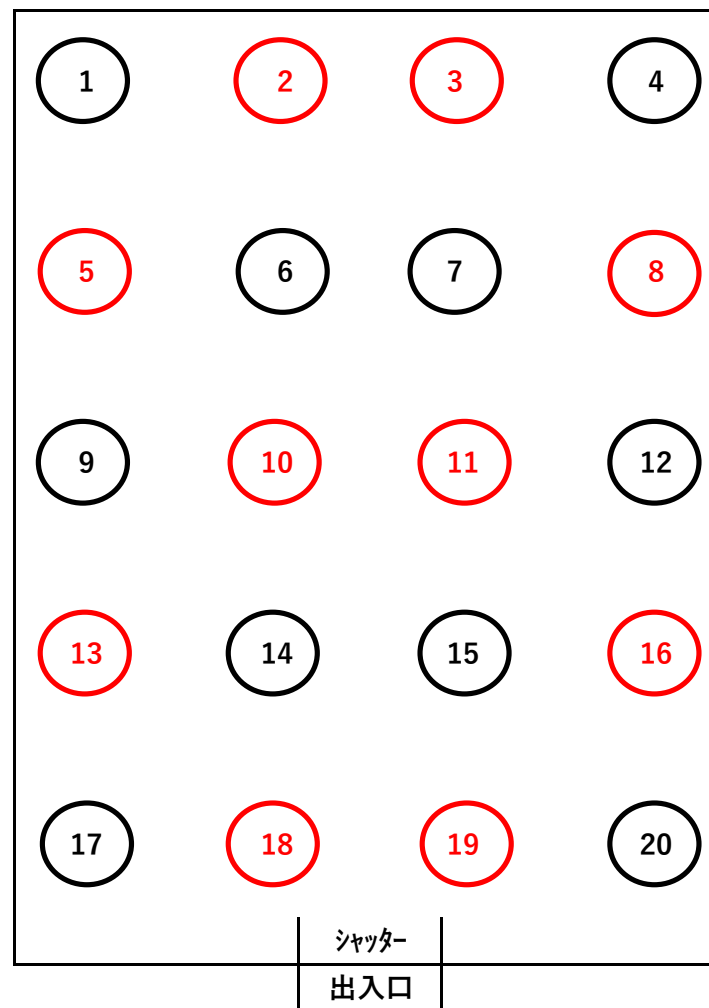

(凡例)

No. (red circle) : 照明交換箇所
測定箇所

No. (black circle) : 測定箇所
